

Задачи:

1. Создать план график выполнения проекта

Комментарии:

1. Необходимо определить состав команды внедрения (предположить с обоснованием)
2. Необходимо предположить сроки внедрения каждого этапа
3. Определить контрольные точки
4. Построить план-график с отметкой контрольных точек

Вариант 1: Производство автомобилей

Состав команды внедрения: при наличии консультанта на каждый функциональный модуль, мы сможем настраивать систему параллельно.

Специалист	Выполняемые задачи
Руководитель проекта	Управление сроками, ресурсами, контроль выполнения этапов
Бизнес-аналитик	Сбор требований, описание бизнес-процессов
Консультант SAP MM	Настройка закупок и снабжения
Консультант SAP PP	Настройка производственного контура
Консультант SAP SD	Настройка продаж и логистики
Консультант SAP FI/CO	Настройка финансового учета и контроллинга
Консультант SAP HCM	Настройка управления персоналом
Разработчик	Разработка доработок и интеграций
Тестировщик	Проверка работы системы
Системный администратор	Настройка инфраструктуры и серверов

Напомню, что было о сроках сказано в ЛР 2:

Название этапа	Длительность внедрения	Обоснование
Анализ	1–2 месяца	Необходимо изучение текущих бизнес-процессов предприятия (закупки, производство, логистика, продажи), сбор требований от всех подразделений (~2500–3000 пользователей)

Разработка	2–3 месяца	Формирование целевой архитектуры системы, описание бизнес-процессов и распределение ролей пользователей в ERP
Настройка	4–6 месяцев	Настройка модулей SAP (MM, PP, SD, FI, CO, HCM), адаптация под процессы предприятия, настройка интеграций
Тестирование	1–2 месяца	Проверка корректности работы всех бизнес-процессов (закупки → производство → продажи), устранение ошибок
Запуск и поддержка	1–2 месяца	Обучение пользователей, перенос данных, запуск системы и сопровождение на начальном этапе


Как это будет выглядеть детально в рабочих днях:

Этап	Длительность	Обоснование
Предпроектное обследование	20 дней	Большое предприятие, много подразделений
Анализ процессов "как есть"	30 дней	Детальный анализ всех бизнес-процессов
Проектирование "как будет"	40 дней	Разработка модели ERP
Настройка системы	80 дней	Настройка модулей SAP
Разработка и интеграции	60 дней	Доработки и интеграции
Тестирование	30 дней	Проверка всех процессов
Обучение пользователей	20 дней	Обучение большого количества сотрудников (может идти как онлайн курсы)
Ввод в эксплуатацию	20 дней	Запуск системы

Контрольными точками будут являться межэтапные дни.

Событие	Описание
Завершение обследования	Сформированы требования и описание процессов
Завершение анализа	Описаны процессы "как есть"
Утверждение проекта	Согласована модель "как будет"
Завершение настройки	ERP настроена под предприятие
Завершение тестирования	Система готова к запуску
Запуск системы	Переход на ERP
Завершение проекта	Стабилизация системы

Отметим эти точки на графике, учитывая, что началось внедрение 12.01.26.

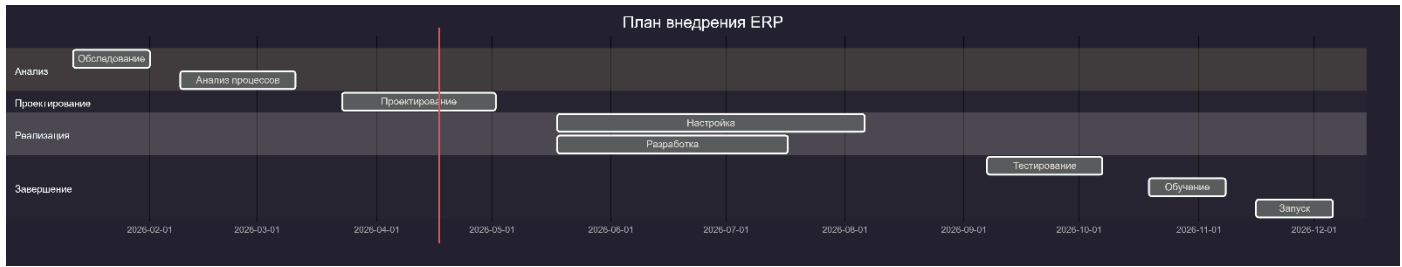

И распишем план-график:

Этап	Ресурсы	Дата начала	Дата окончания
Предпроектное обследование	Аналитик, РМ (2 чел)	12.01.2026	06.02.2026
Анализ процессов	Аналитик + консультанты (4 чел)	09.02.2026	20.03.2026
Проектирование	Аналитик + SAP консультанты (5 чел)	23.03.2026	15.05.2026
Настройка системы	SAP консультанты (6 чел)	18.05.2026	04.09.2026
Разработка	Разработчик (1-2 чел)	18.05.2026	31.07.2026
Тестирование	Тестирующий + аналитик (2-3 чел)	07.09.2026	16.10.2026
Обучение	Консультанты (3-6 чел)	19.10.2026	13.11.2026
Запуск	Вся команда	16.11.2026	11.12.2026
